


Trafikverket **Gävle kommun** **Region Gävleborg**

Avtal

Kort info om järnvägsplan Tolvforsskogen-Kringlan
Tidplan järnvägsplan Tolvforsskogen-Kringlan
 Sista dag för ev. inspel från kommunen som påverkar jp: 1 juni 2023
 Projekteringsstopp Järnvägsplan: Sep 2023
 Samråd på orten: Jan-feb 2024
 LST godkänner MKB: Okt/nov 2024
 Planen till planprövning: Hösten 2025
 Laga kraft vunnna plan: Slutet 2026
 Byggnation och invigning 2036: 2027/28- 2036

Kort info om kommunens detaljplaner
Tidplan detaljplan 1 Tolvforsskogen, etapp 1
 Samråd: Q1 2024
 Granskning: Q3 2024
 Antagande: Q1 2025
 Laga kraft: Q1 2025 (om ingen överklagar)
Tidplan detaljplan 2 Tolvforsskogen, etapp 1
 Samråd: Q1 2024
 Granskning: Q3 2024
 Antagande: Q1 2025
 Laga kraft: Q1 2025 (om ingen överklagar)

Milstolpar
 Planprogram Tolvforsskogen
 Klart: 2022
 Avsiktsförklaring Tolvforsskogen del 1 passager
 Klart: 2022
 Avsiktsförklaring Tolvforsskogen del 2 (hela Tolvforsskogen)
 Start: 2022
 Klart: juni 2023
 Finansieringsavtal Tolvforsskogen passager
 Start: mars 2023
 Klart: 2023
 Genomförandavtal
 Start: Ej fastställt
 Klart: Ej fastställt

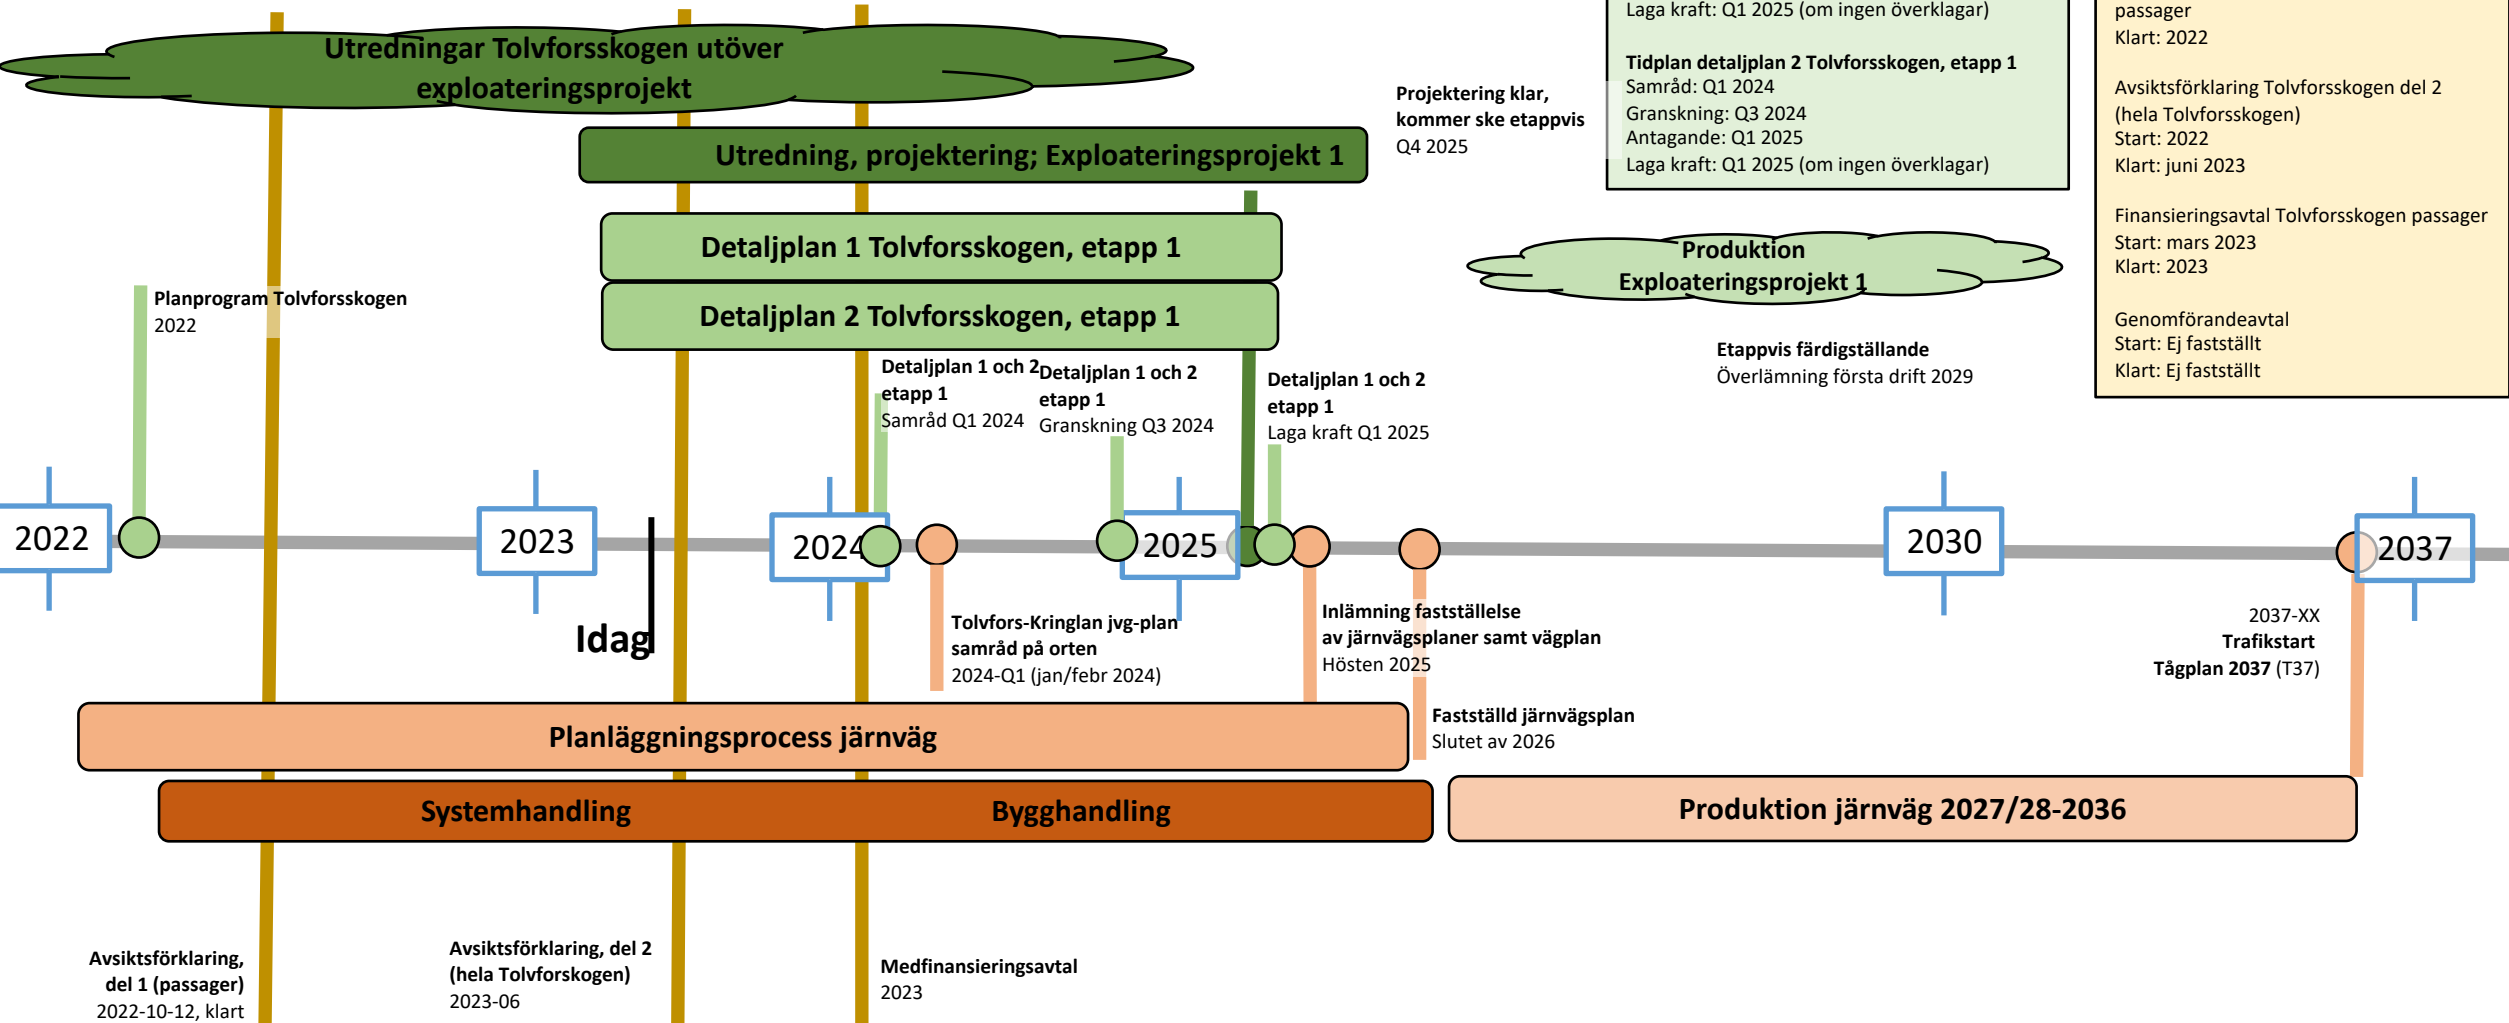

Gemensam tidplan för sträckan i likhet med Järnvägsplan Tolvforsskogen-Kringlan samt pågående detaljplaner

Trafikverket
Gävle kommun
Region Gävleborg

Avtal

Milstolpar
-Planprogram Tolvforssskogen, klart: 2022
-Beslut om planuppdrag detaljplan etapp 1 (dpl nr 2), 2023-04-26
-Järnvägsplanerna måste vara fastställda innan vägplanen kan bli fastställd.

Kort info om kommunens detaljplaner
Tidplan detaljplan Tolvforssskogen etapp 1 (dpl nr 2)
Samråd: Q1 2024
Granskning: Q3 2024
Antagande: Q1 2025
Laga kraft: Q1 2025 (om ingen överklagar)

Tidplan upphävande av detaljplaner Gävle C - Tolvforssskogen
Samråd: Q4 2023
Granskning: Q3 2024
Antagande: Q4 2024
Laga kraft: Q1 2025

Kort info om vägplanen för tpl Gävle Norra
Tidplan vägplan tpl Gävle Norra
Dec 2022 Konsult slutar rita på handlingar som ska visas på samrådet.
April 2023 Trv får ta del av handlingar som ska visas på samrådet.
Maj/Juni 2023 Trv samråder med särskilt berörda och har öppet hus för allmänhet.
Q3 2024 Granskning av planen (samtidigt som jp Gävle C-Tolvforssskogen).
Q4 2025 Planen till planprövning (skickas in efter jvg-planerna)
Q4 2026 Laga kraft vunnen plan (under förutsättning att jvg-planerna och dp Tolvforsskogen (etapp 1 (dpl nr 2) vinner laga kraft.
2029-2032 Byggnation och invigning 2032.


Utredningar Tolvforssskogen utöver exploateringsprojekt,

Utredning, projektering; Exploateringsprojekt 1

Detaljplan Tolvforssskogen etapp 1 (dp 2)

Upphävande av detaljplaner

Produktion Exploateringsprojekt 1

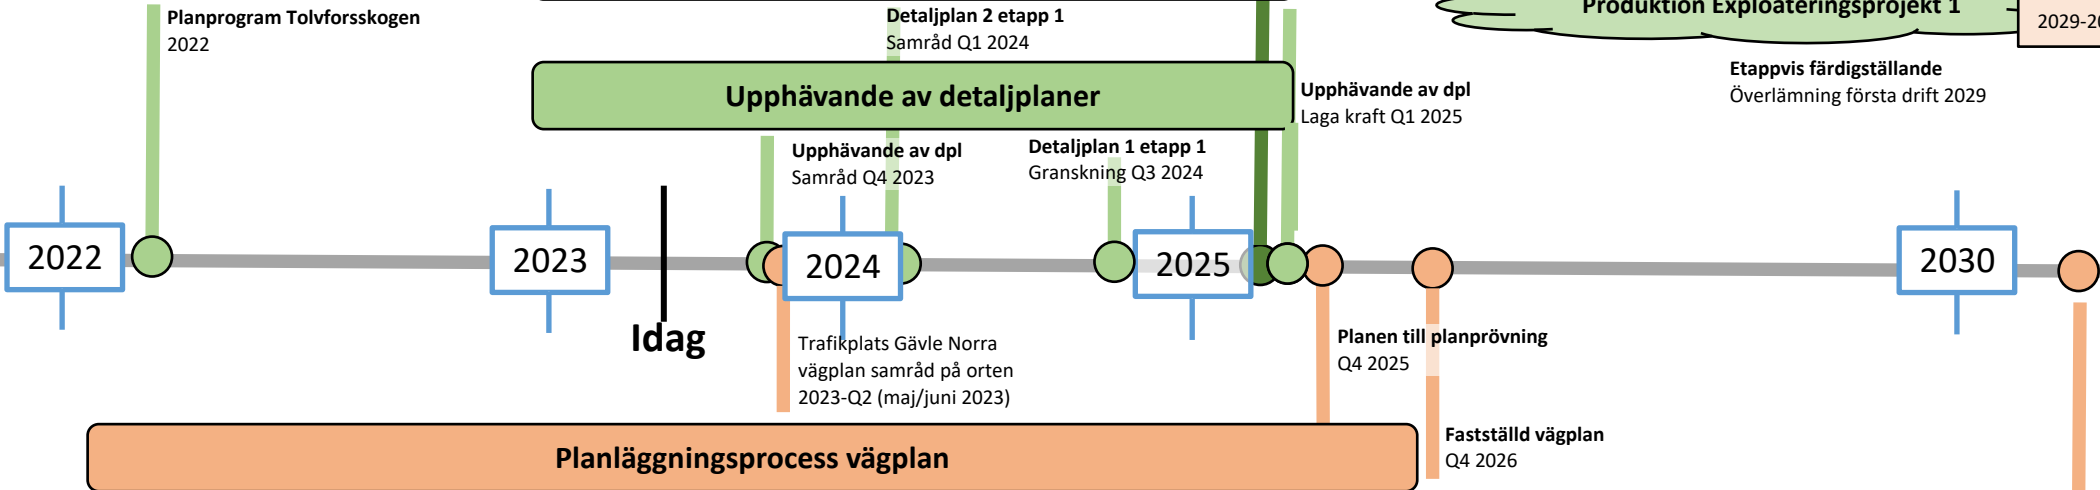

OKB projektets tidsplan och beroenden, delen vägplan tpl Gävle Norra samt pågående detaljplaner
